

Проектный офис Министерства образования и науки Республики Тыва

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ГУБЕРНАТОРСКОГО ПРОЕКТА
«В КАЖДОЙ СЕМЬЕ – НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО РЕБЕНКА С ВЫСШИМ
ОБРАЗОВАНИЕМ»**

УТВЕРЖДЕНО
Проектным комитетом
Министерства образования
и науки Республики Тыва
«29» декабря 2017 г. № 50-ПО
 Т.О. Санчаа

г. Кызыл

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ГУБЕРНАТОРСКОГО ПРОЕКТА
«В КАЖДОЙ СЕМЬЕ – НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО РЕБЕНКА С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ»**

1. Основные положения

Дата отчета	29 декабря 2017 г.	
Наименование направления	Образование	
Код проекта		
Краткое наименование проекта	«В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»	Срок начала и окончания проекта 2017 г. (с даты утверждения) 31.12.2020 г.
Куратор проекта	Нагсак О.Д.- первый заместитель председателя Правительства Республики Тыва	
Старшее должностное лицо (СДЛ)	-	
Функциональный заказчик	Санчаа Т.О., министр образования и науки Республики Тыва	
Руководители проекта	Товуу С.С., заместитель министра образования и науки Республики Тыва	
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Министерство образования и науки Республики Тыва, Институт развития национальной школы, Институт оценки качества образования, Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований, Тувинский институт развития образования и повышения квалификации, Республиканский центр развития профессионального образования, Республиканский центр дополнительного образования, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию), ФГАОУ ВПО «Сибирский Федеральный университет» (по согласованию), 19 муниципальных органов управления образования, 4 общеобразовательные республиканские учреждения, 159 общеобразовательных организаций, 10 вечерних школ, 18 образовательных организаций профессионального образования, дошкольные образовательные учреждения Республики Тыва.	

2. Сводная информация о реализации приоритетного проекта

Наименование	Оценка достижения	Статус достижения	Комментарий
Цель проекта	Создание условий, благоприятной психолого-педагогической, социальной среды в достижении высшего образования детей из семей республики, не имеющих членов семьи с высшим образованием в 3-х поколениях	■	
Показатели проекта	Увеличение количества выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в вузы, из семей, не имеющих детей с высшим образованием в 3-х поколениях семьи, по окончании программы обучения основного общего образования	■	Из 455 чел. 167 человек поступили в ВУЗы (37%), в учреждения СПО - 242 чел. (54%), на подготовительные курсы ТуВГУ-2 чел. (0,5%), призваны в армию- 18 чел. (4%), трудоустроился на работу- 2 чел. (0,5%), не трудоустроены- 14 чел. (3,5%). Плановый показатель 2017 г. не достигнут на 23% , в сравнении с 2016 г. произошло повышение – на 2% .
Результаты проекта	По первому показателю из 455 выпускников школ в ВУЗы поступили 167 чел., что составило 37% , не достижение показателя на 23% . По второму показателю из 97 выпускников СПО поступили 48 чел. или 49% , показатель перевыполнен на 25% .	■	Из 97 участников проекта, выпускников учреждений СПО 48 выпускников (49%) поступили в ВУЗы, что больше установленного показателя на 25% . В сравнении с 2016 годом снижение на 0,6% . В отпуске по уходу за ребенком – 5 чел. (6,8%), призваны в армию – 6 чел. (6,1%), устроились на работу – 17 чел. (21,6%), не трудоустроены – 3 чел. (3%), поступили в учреждения СПО РФ- 14 чел. (14,4%).

Сроки проекта	2017 г. (с даты утверждения) 31.12.2020 г.	
Бюджет проекта	4,704 млн. рублей	

- менее 50%

- от 50% до 95%

- более 95%

3. Отчет о достижении цели и показателей приоритетного проекта 3.1. Информация о достижении цели приоритетного проекта

Цель проекта	Критерии достижения цели	Целевые значения	Фактические значения
Создание условий, благоприятной психолого-педагогической, социальной среды в достижении высшего образования детей из семей республики, не имеющих членов семьи с высшим образованием в 3-х поколениях	Увеличение количества выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в вузы, из семей, не имеющих детей с высшим образованием в 3-х поколениях семьи, по окончании программы обучения основного общего образования	60 (%)	37 (%)
	Увеличение количества выпускников образовательных организаций профессионального образования, поступивших в вузы, из семей, не имеющих детей с высшим образованием в 3-х поколениях семьи, по окончании программы профессионального образования	24 (%)	48 (%)
Итого: Цели проекта по первому показателю не достигнуто на 23%, По второму показателю перевыполнено на 24%.			

3.2. Информация о достижении показателей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение (на момент утверждения паспорта проекта)	Период, год		Итоговое значение (на момент завершения проекта)
				План	Факт	
					2017	

1	Увеличение количества выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в вузы, из семей, не имеющих детей с высшим образованием в 3-х поколениях семьи, по окончании программы обучения основного общего образования	Основной	35 (%)	60 (%)	37 (%)	Не достижение показателя на 23 %
2	Увеличение количества выпускников образовательных организаций профессионального образования, поступивших в вузы, из семей, не имеющих детей с высшим образованием в 3-х поколениях семьи, по окончании программы профессионального образования	Основной	24 (%)	24 (%)	48 (%)	Перевыполнение показателя на 24%.
Итого: из 2 показателей, по первому показателю не достижение на 23%.						

4. Отчет о достижении результатов приоритетного проекта

№ п/п	Наименование результата	Требование к результату	Статус достижения	Комментарий и причины отклонений
1	Увеличение количества выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в вузы, из семей, не имеющих детей с высшим образованием в 3-х поколениях семьи, по окончании программы обучения основного общего образования	Уменьшение количества семей, находящихся на пороге бедности, через государственную поддержку в виде педагогического и социального сопровождения не менее чем одного ребенка в семье в процессе его обучения в школе в период его поступления в вуз и обучения в вузе. Преодоление бедности населения за счет выравнивания возможностей выпускников из семей разного социального положения при получении высшего образования детьми из семей, относящихся к фактору риска (безработица родителей выпускника, трудная жизненная ситуация), с учетом скудных доходов семьи или в виду полного отсутствия доходов семьи. Государственная поддержка семей из данной категории.	Не получен	Количество выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в вузы 2017 года меньше установленного плана (60%), в связи с низкими результатами сдачи Единого государственного экзамена участниками губернаторского проекта.
2	Увеличение количества выпускников	Предотвращение роста преступности, снижение уровня безработицы среди граждан. Рост		Количество выпускников


<p>образовательных профессионального образования, поступивших в вузы, из семей, не имеющих детей с высшим образованием в 3-х поколениях семьи, по окончании программы профессионального образования</p>	<p>показателей по основным параметрам прогноза социально-экономического развития Республики Тыва на 2017-2020 годы на аратских стоянках, в деревнях, селах, поселковых центрах и городах республики.</p> <p>Обеспечение отраслей экономики Республики Тыва кадрами по востребованным и приоритетным направлениям подготовки (инженерные, военно-инженерные, инженерно-технические, сельскохозяйственные специальности).</p>	<p>Получен</p>	<p>образовательных организаций профессионального образования, поступивших в вузы в 2017 году увеличилось на 48%, что больше установленного плана (24%).</p>
---	---	----------------	---

5. Отчет о соблюдении сроков приоритетного проекта

5.1 Информация о сроках реализации приоритетного проекта

Плановая длительность, мес.	Фактическая длительность, мес.	Отклонение, %	Комментарий и причины отклонений
12 мес.	12 мес.	-	

5.3. Динамика исполнения контрольных точек приоритетного проекта

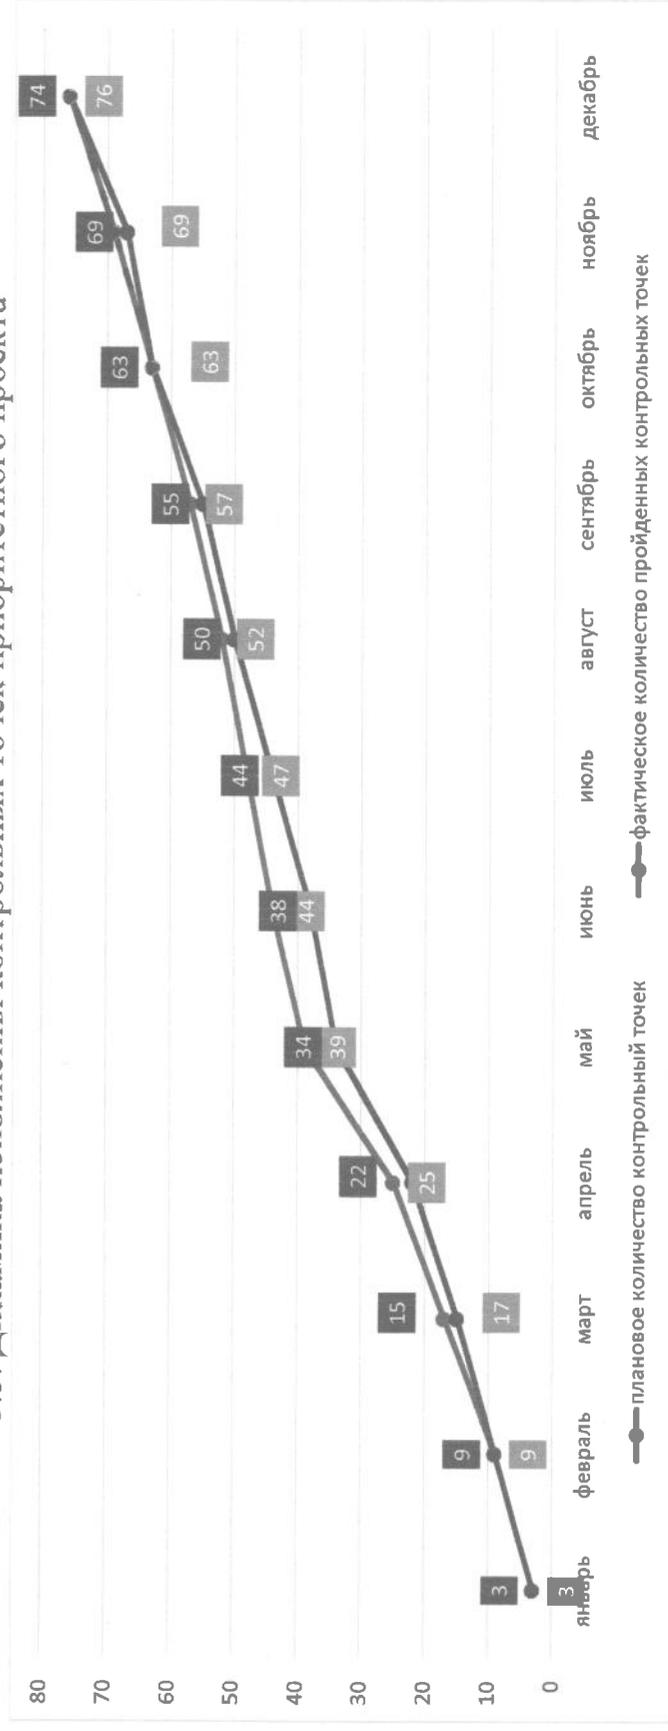

5.4. Информация об исполнении календарного плана-графика приоритетного проекта

№ п/п	Наименование	Тип контрольной точки	Плановый срок выполнен	Фактический срок выполнения	Отклонение, дней	Комментарий и причина отклонений
1.	Разработка и утверждение паспорта проекта	Исполнено. Индикативные показатели проекта утверждены Постановлением Правительства Республики Тыва от 03 июня 2014 года № 209-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») Республики Тыва по реализации губернаторского проекта «В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием» на 2014-2020 годы».	31.01.	03.06.	6 месяцев	Отклонение
2	Разработка сводного плана	Сводный план проекта разработан	27.02.	27.02.	0	В срок
3	Выдвижение кандидатур в состав муниципальных комиссий по выявлению, отбору и определению участников проекта. Утверждение состава комиссии муниципальными образованияами, городскими округами по отбору участников проекта	Исполнено. Муниципальные комиссии сформированы	31.01.	31.01.	0	В срок
4	Утверждение списков участников проекта комиссиями по выявлению, отбору и определению участников проекта с 6 по 11 классы	Исполнено. Списки утверждены муниципальными комиссиями.	30.01.	30.01.	0	В срок
5	Отбор, выявление и определение участников проекта из числа обучающихся с 1-4 классы, детей от 3 до 6 лет, утверждение списков	Исполнено. На основании заявления подтвержденных документов об отсутствии родителей с высшим образованием утверждены постановление Администрации муниципальных образований Республики Тыва отбор участников в губернаторский проект осуществлен	20.04.	20.04.	0	В срок
6-7	Свод, анализ утвержденных списков участников проекта с 1-11 классы, дошкольников	Исполнено. Сформирована база данных участников проекта. После утверждения приказом Министерства образования и науки РТ от	20.04. 30.11.	20.04. 30.11.	0	В срок
8-9	Формирование социального паспорта семьи и плана индивидуального сопровождения участников проекта	Исполнено. Формированы социального паспорта участников проекта с 1 по 11 классов собраны планы индивидуального сопровождения участников проекта сформированы.	30.03. 30.11.	30.03. 30.11.	0	В срок

10-11	Формирование базы данных семей, участников проекта с 1-11 классы, детей дошкольного возраста от 6-7 лет	Исполнено. База данных сформирована. Издан приказ Министерства образования и науки РТ от 21 декабря 2017 года № 1353-д «Об утверждении списка участников губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» на 2017 – 2018 учебный год	30.05, 30.11.	30.05, 21.12.	0	Задержка предоставления утвержденных баз данных муниципальных участников проекта.
12	Совместно с Агентством по делам семьи и детей РТ разработать и утвердить социальной паспорт семей участников проекта с учетом внесенных дополнительных сведений в муниципальные образовательные учреждения Таблицу по участникам проекта ОРВО, по количеству человек с высшим образованием, детям дошкольного возраста от 3 до 6 лет, обучающимся с 1-11 классы	Исполнено. Распоряжением Правительства РТ от 21.03.2017 г. №133-р «О мерах по социально-педагогическому сопровождению семей участников проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» в муниципальных образовательных учреждениях Таблицу по участникам проекта ОРВО, по количеству человек с высшим образованием, детям дошкольного возраста от 3 до 6 лет, обучающимся с 1-11 классы	30.03.	21.03.	0	В срок
13	Внести изменения в Постановление Правительства Республики Тыва от 12 марта 2015 г. № 98 «О мерах социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях высшего образования в рамках губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием».	Исполнено. Принято Постановление Правительства РТ от 18 декабря 2017 г. № 547 «Об утверждении Порядка реализации проекта Главной поддержки обучающихся Республики Тыва «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»	30.03.	18.12.	9 месяцев	Проект Правительства РТ о реализации проекта прошел долгий процесс согласования у Заместителей Председателя Правительства РТ.
14	Разработать проект постановления Правительства Республики Тыва «Порядок реализации проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» с учетом поручений Главы РТ об охвате участников проекта из числа детей от 3 до 6 лет, неохваченных в ДОУ, а также детей из числа обучающихся с 1 по 5 классы общеобразовательных организаций.	Исполнено. Принято Постановление Правительства РТ от 18 декабря 2017 г. № 547 «Об утверждении Порядка реализации проекта Главной поддержки обучающихся Республики Тыва «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»	30.03.	18.12.	9 месяцев	Проект Правительства РТ о реализации проекта прошел долгий процесс согласования у Заместителей Председателя Правительства РТ.
15	Разработать и утвердить критерии эффективности деятельности муниципальных образований, руководителей научных организаций, подведомственных учреждений РТ в реализации проекта «ОРВО»	Исполнено. Критерии эффективности муниципальных образований, руководителей научных организаций, подведомственных учреждений РТ в реализации проекта «ОРВО» разработаны.	28.06.	28.06.	0	В срок

16	Соглашение о взаимодействии между Министерством культуры Республики Тыва и будет включен в новый проект паспорта Министерства образования и науки Республики Тыва по повышению культурного уровня участников проекта через посещение достопримечательностей Тувы, участие в конкурсах, проводимых	Исполнено. Межведомственный план разработан и будет включен в новый проект паспорта Министерства образования и науки Республики Тыва по повышению культурного уровня участников проекта через посещение достопримечательностей Тувы, участие в конкурсах, проводимых	30.05.	22.11.	0	Отклонение
17	Разработка проекта Распоряжения Правительства РТ по межведомственному взаимодействию в рамках реализации проекта	Исполнено. Разработаны, утверждены будут по итогам принятия Постановления Правительства РТ о ходе реализации проекта.	30.04.	27.12	9 месяцев	Отклонение
18	Проведение научного исследования по определению уровня образованности семей в разрезе муниципальных образований, городских округов	Исполнено. Анализ представлен.	30.04	30.04.	0	В срок
19	Разработка методических рекомендаций по сопровождению участников проекта с 1 по 11 классы и дошкольного возраста	Исполнено. Методические рекомендации разработаны, находятся у закрепа Правительства Ш.Х.Холуя.	01.04	29.12.	0	Методические рекомендации находятся на согласовании у Заместителя Председателя Правительства РТ.
20	Проведение мониторинга профессиональных намерений участников проекта 11 классов.	Исполнено. Сводный анализ подготовлен, отчет по профилям представлен.	20.02.	20.02.	0	В срок
21-22	Тестирование и консультирование участников проекта по выбору будущей профессии	Исполнено. Тестирование и консультирование участников проекта по выбору будущей профессии проведено во всех муниципальных образованиях республики.	25.02. 25.11.	25.02. 25.11.	0	В срок
23	Мониторинг поступления участников проекта в ОВО и СПО	Исполнено. Мониторинг по поступлению участников проекта в ОВО и СПО проведен. По итогам мониторинга: По первому показателю – из 455 чел. 167 человек поступили в ВУЗы (37%), в учреждения СПО - 242 чел. По второму показателю - из 97 участников проекта, выпускников учреждений СПО 48 выпускников (49,4%) поступили в ВУЗы, что больше установленного показателя на 25,4%.	01.10.	01.10.	0	В срок
24-25	Мониторинг успеваемости, движения отсева участников проекта, поступивших в ОВО и СПО	Исполнено. Замыное сессии 2016-2017 учебного года на оценку «отлично» завершили 11 чел. (19%), на оценку «хорошо» 32 чел. (58%), и на оценку «удовлетворительно» - 12 чел. (23%) В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 12 марта 2015 г. № 98 на оказание социальной поддержки необходимо выделить 222000 руб. (денежные средства имеются).	01.02.	01.02.	0	В срок

38-40	Организация родительских собраний по разъяснению об участии в проекте	Исполнено. Собрания проведены.	25.02. 31.03. 20.12.	0	В срок
41	Организация мероприятий по охвату детей дошкольного возраста (6-7 лет), участников проекта, программами дошкольного образования разных форм (кратковременные группы пребывания, мини-школы)	Исполнено. Всего дошкольников, не охваченных подготовкой к школе - 60 чел., из них на отчетный период охвачено 30 детей (32 %) в том числе в мини-школах-19, в группах кратковременного пребывания- 11 чел., по остальным детям работа по охвату ведется.	01.08.	0	В срок
42	Контроль над качеством обучения участников проекта	Исполнено. С целью проверки качества обучения учащихся, в том числе участников проекта были организованы выезды в школы г. Ак-Довурака, Баруу-Хемчикского, Сут-Хольского, Олужского, Тес-Хемского колхозов. Проверке выявлено, что контроль над качеством обучения в школах организован и ведется системная работа по сопровождению учащихся, в том числе выпускников, участников проекта.	25.05.	0	В срок
43	Организация и контроль над проведением элективных курсов и консультаций для выпускников по подготовке к ГИА в форме ЕГЭ	Исполнено. В рамках выездов в школы г. Ак-Довурака, Баруу-Хемчикского, Сут-Хольского, Олужского, Тес-Хемского колхозов была проведена работа с выпускниками, участниками проекта.	25.05.	0	В срок
44-45	Проведение контрольных замеров в рамках подготовки выпускных 11-х классов к сдаче ЕГЭ. Промежуточный контроль.	Исполнено. Итоги замеров представлены.	15.03. 15.05.	0	В срок
46	Обеспечение индивидуального сопровождения участников проекта при подготовке к сдаче ЕГЭ в отчетном году	Исполнено. В течение года обеспечивалось индивидуальное сопровождение участников проекта, выпускников школ. На все школы, были распространены технологии индивидуального сопровождения проекта «Успешный выпускник».	25.05.	0	В срок
47	Дистанционные уроки	Исполнено. В период с 01.02.2017г. по 18.05.2017г. сотрудниками ТИРОНПК проведена 17 онлайн-занятий с выпускниками из труднодоступных и малокомплектных школ. Из них 11 занятий по математике (базовый уровень) и 6 занятий по русскому языку. Занятия посетили 1006 учащихся из 26 школ-участниц проекта.	25.05. 18.05.	0	В срок
48	Оформление портфолио участников проекта по итогам учебного года	Исполнено. Портфолио участников оформлены.	25.06.	0	В срок
49	Профилактика здоровья участников проекта из числа обучающихся с 1-11 классы общеобразовательных организаций	Исполнено. В течение учебного года во всех школах проводилась системная работа по профилактике ЗОЖ, в том числе среди участников проекта.	25.05.	0	В срок

50	Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий	Исполнено. Культурно-массовые и спортивные мероприятия проведены во всех муниципальных образованияах, отчеты представлены.	25.05.	25.05	0	В срок
51	Организация работы по направлению участников проекта в летние оздоровительные лагеря	Исполнено. За летний оздоровительный период в рамках «Летнего отдыха» было охвачено 2553 участника проекта. В 1 смену – 1250; 2 смена – 839, 3 смена – 264 чел.	31.08.	31.08.	0	В срок
52	Работа с одаренными детьми из числа участников проекта. Проведение предметных олимпиад.	Исполнено. Предметные олимпиады проведены во всех муниципальных образованияах.	20.10.	20.10	0	В срок
53	Сдача государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ	Исполнено. ЕГЭ проведено.	20.06.	20.06.	0	В срок
54	Организация встреч с учеными научных институтов	В исполнении. Встречи с сотрудниками научных институтов перенесены на 2018 год в связи с планированием проведения «Декады науки» с 20.01 по 05.02.2018 года.	20.12.	05.02.18.	2 месяца	В период «Декады науки» будет проведен.
55	Проведение экскурсионных выездов по объектам культурного наследия Тувы	В исполнении. Проведение экскурсионных выездов по объектам культурного наследия Республики Тува перенесено на январь 2018 года.	20.12.	30.01.18	1 месяц	Экскрсионные выезды участников проекта запланированы на январь 2018 года.
56-57	Организация мероприятий в рамках месячника профориентации	В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 10 апреля 2017 года № 156-р «О проведении месячника по профессиональной ориентации среди обучающихся в выпускников» всех школ, проведен с 5 апреля по 5 мая проведен месячник по профессиональной ориентации. Проведен мониторинг выбора профессий и вузов участниками проекта.	30.10. 30.04.	30.10. 30.04.	0	В срок
58	Привлечение участников профориентационные мероприятия в рамках движения «WS», «JS»	Исполнено.	20.12.	20.12	0	В срок
59	Привлечение участников проекта в День открытых дверей ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»	Исполнено. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 10 апреля 2017 года № 156-р «О проведении месячника по профессиональной ориентации среди обучающихся и выпускников» всех школ проведены с 5 апреля по 5 мая проведен месячник по профессиональной ориентации.	25.05.	25.05.	0	В срок

63	Мероприятия по приему заявлений и документов от студентов-участников проекта для участия в конкурсе на социальную поддержку и проведение конкурсных процедур	Исполнено. На рассмотрение Комиссии по социальной поддержке обучающихся в образовательных организациях высшего образования в рамках губернаторского проекта «3 каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» поступило всего 74 заявления на участие участников губернаторского проекта. По итогам работы комиссии одобрено 51 заявление.	14.07.	14.07.	0	В срок
64-72	Ознакомление широкой общественности, населения о ходе реализации проекта	Исполнено. Информация выставляется на сайте Минобрнауки РФ в социальных сетях.	24.04. 25.05. 25.06. 25.07. 25.08. 25.09. 25.10. 25.11. 25.12.	24.04. 25.05. 25.06. 25.07. 25.08. 25.09. 25.10. 25.11. 25.12.	0	В срок
73	Достижение индикаторов по поступлению участников проекта в вузы Российской Федерации	Исполнено. Показатели поступления в 2017 г. Из 455 участников проекта поступили в ВУЗы страны 167 человек (37%), в учреждения СПО – 241 чел. (54%) на подготовительные курсы (4%), трудоустроены на работу – 2 чел. (0,5%), не трудоустроены – 14 чел. (3,5%). Плановый показатель 2017 г. не достигнут на 23%, в сравнении с 2016 г. произошло повышение – на 2%.	25.08.	25.08.	0	В срок
74	Оценка эффективности работы муниципалитетов по итогам реализации проекта за отчетный год	Исполнено. Муниципальные образования представили самооценку по критериям и оценке результативности эффективности деятельности муниципалитетов и городских округов.	29.10	29.10	0	В срок

75	Итоговое заседание по реализации проекта с участием исполнителей	30.09	26.12.	2 месяца	В связи с утверждением критериев эффективности деятельности муниципальных образований реализация проекта заседания по подведению итогов было перенесено. Проведено 26 декабря 2017 г. №49-ПО.
76	Итоговый годовой отчет по реализации проекта	25.10	28.12	0	В срок

6. Отчет об исполнении бюджета приоритетного проекта

Источники финансирования	Год реализации 2016-2017 гг.	
	План	Факт
Бюджетные источники, млн.руб.	0	0
Федеральный бюджет, тыс. рублей		
Бюджеты субъектов Российской Федерации, тыс. рублей	4,704	0,724
Местные бюджеты органов местного самоуправления, тыс. рублей	0	0
Внебюджетные источники, тыс. руб.	0	0
Итого, млн. руб.	4,704	0,724
Отклонение, %	-	3,980
